

MPCEIP - Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
VAP-Subsecretaría de Recursos Pesqueros
Dirección de Pesca Artesanal

PROYECTO: I002 MPCEIP-Impulso para la reactivación productiva y económica de la pesca artesanal post pandemia COVID 19.

Líder del Proyecto:	Cedeño Vera, Carlos Favio (ccedeno@produccion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castro Briones, Edwin Xavier	Programas Relacionados:	
Titular:	Vinueza Mosquera, Tanya Gabriela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Comercial	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	08/01/2021 - 28/12/2021
Fecha de última actualización:	02/12/2021	Fecha de Fin Base:	30/11/2021
Modificado por:	Cedeño Vera, Carlos Favio	Fecha del siguiente Hito:	02/12/2021

DATOS GENERALES

Descripción

JUSTIFICACIÓN:

La pesca en el Ecuador se realiza de manera artesanal e industrial. La primera, se desarrolla en zonas costeras y oceánicas, mismas que capturan recursos hidrobiológicos como: pelágicos, demersales, bentónico e incluyendo los crustáceos y moluscos recolectados en los estuarios para proveer de productos frescos para el mercado interno. La mayor fortaleza de este sector está en su experiencia y eficiencia en la fase extractiva, pero en las fases de post producción, procesamiento y comercialización persisten dificultades. La pesca artesanal al ser fuente de empleo es considerada como un motor económico para un sin número de familias, la pesca artesanal es desempeñada normalmente por hombres los cuales han tenido conocimiento de la misma por sus ancestros o han aprendido por una mejor estabilidad.

A nuestra dependencia han ingresados varias solicitudes de las organizaciones pesqueras de las diferentes provincias, solicitando el apoyo para la reactivación productiva post emergencia por el COVID 19, mismo que en sus comunicados han manifestado el deseo de participar en proyectos de reactivación. En este sentido, la Dirección de Pesca Artesanal con la participación de las organizaciones pesqueras artesanales, presenta el proyecto denominado "Impulso para la reactivación productiva y económica de la pesca artesanal post pandemia COVID 19" el cual tiene como objetivo brindar y acompañar a las organizaciones pesqueras artesanales a fortalecer la comercialización pesquera con valor agregado de manera asociativa.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto denominado "Impulso para la reactivación productiva y económica de la pesca artesanal post pandemia COVID 19" fortalecerá los canales de comercialización de la pesca artesanal con valor agregado, con la participación de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y el apoyo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:

Impulsar la reactivación productiva de la pesca artesanal con asistencia técnica en la ejecución de ferias o actividades productivas y exposiciones de productos de la pesca artesanal con valor agregado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Articular con los GADS Provinciales, Cantonales y Parroquiales, la ejecución de ferias productivas y canales de comercialización.
- Asistencia Técnica a las organizaciones pesqueras artesanales en temas de fortalecimiento productivo. # Seguimiento técnico por parte de los analistas de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.

PRODUCTO / SERVICIO: Implementación de ferias o actividades de comercialización de productos pesqueros.

Asistencia Técnica a las organizaciones pesqueras artesanales en temas de fortalecimiento productivo

Beneficios Cualitativos

El presente proyecto tiene como propósito fortalecer los diferentes canales de comercialización de la pesca artesanal con valor agregado. Las organizaciones pesqueras que participarán en estos eventos o actividades tendrán el acompañamiento técnico de los analistas de la Dirección de Pesca Artesanal.

La ejecución de este proyecto tiene la visión con enfoque social y productivo, a fin de mejorar sus niveles de ingresos económicos y lo más importantes es dar a conocer los productos hechos artesanalmente y en preparación.

Tipo de Beneficiario

Beneficiario interno: La Subsecretaría de Recursos Pesqueros.

Beneficiario externo: Organizaciones pesqueras artesanales, Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Cantonales y Parroquiales.

Restricciones

RESTRICCIONES:

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 11 meses.

COSTO: El proyecto no tiene presupuesto asociado.

ALCANCE: Ejecución de ferias o actividades con las organizaciones pesqueras artesanales del perfil costero y aguas interiores a nivel nacional.

RECURSOS: Analista 3, Analistas 2, materiales (carpas, mesas, equipos tecnológicos).


SUPUESTOS:

- Apoyo de las organizaciones pesqueras artesanales que participarán en las ferias productivas y eventos y del equipo técnico de la Dirección de Pesca Artesanal.
- Cumplimiento del cronograma de encuestas.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 92.68 %
 Fecha de Inicio: 08/01/2021 Fecha de Fin: 28/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

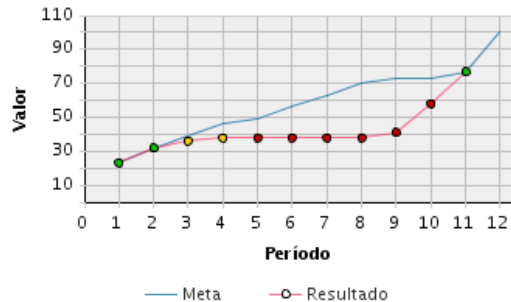

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	23 %	32 %	39 %	46 %	49 %	56 %	63 %	70 %	73 %	73 %	77 %	100 %
	Avance real acumulado											
	23 %	32 %	36 %	38 %	38 %	38 %	38 %	38 %	41 %	58 %	77 %	
Estado												
	●	●	▼	▼	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●	

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2021 1. Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras de los cantones Vinces, Babahoyos y Quevedo de la provincia de Los Ríos, realizada. (HITO No. 19, CUMPLIDO).	Cedeño Vera, Carlos Favio	02/12/2021 - 01:17 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Feria productiva o actividad de comercialización en provincia de Los Ríos, realizada. (HITO No. 20, CUMPLIDO).</p> <p>3. Articulación con la Prefectura de Esmeraldas, solicitando el apoyo institucional, efectuada. (HITO No. 21, CUMPLIDO).</p> <p>4. Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras de los cantones San Lorenzo, Esmeraldas y Muisne de la provincia de Esmeraldas, realizada. (HITO No. 22, CUMPLIDO).</p> <p>5. Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Esmeraldas, realizada. (HITO No. 23, CUMPLIDO).</p> <p>6. Segundo Informe de avances de actividades y resultados al Director de Pesca Artesanal, presentado. (HITO No. 24, CUMPLIDO).</p>		
<p>OCTUBRE 2021</p> <p>1. Asistencia técnica a la Aso. Pesquera Don Juan, con la finalidad de participar en una feria productiva que se desarrollará en el GAD Jama. (HITO No. 12, CUMPLIDO).</p> <p>2. Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Jama de la provincia de Manabí, realizada. (HITO No. 13).</p> <p>3. Primer informe de avances del proyecto de gasto corriente que lleva a cabo la DPA. (HITO No. 14, CUMPLIDO).</p> <p>4. Mediante Oficio Nro. MPCEIP-VAP-2021-0489-O, se invita a participar a la feria del cangrejo y el día del cangrejo que se realizará en el cantón Naranjal. (HITO No. 15, CUMPLIDO).</p> <p>5. Asistencia técnica a las organizaciones pesqueras 6 de julio y nuevo porvenir del cantón Naranjal, para participar en la feria del cangrejo y del día del cangrejo ecuatoriano. (HITO No. 16, CUMPLIDO).</p> <p>6. Ejecución de la feria del Guariche y el día del cangrejo ecuatoriano, con la participación del Viceministro de Acuicultura y Pesca. (HITO No. 17, CUMPLIDO).</p> <p>7. Mediante Oficio Nro. MPCEIP-SRP-2021-3519-O, se solicita al Alcalde del GAD Quevedo la articulación de la feria con la Aso. Pesquera Artesanal Rosa Diana (HITO No. 18, CUMPLIDO).</p>	Cedeño Vera, Carlos Favio	04/11/2021 - 11:21 AM
<p>SEPTIEMBRE 2021</p> <p>1. Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Tosagua de la provincia de Manabí, realizada. (HITO No. 10, CUMPLIDO).</p>	Cedeño Vera, Carlos Favio	04/10/2021 - 06:54 PM
<p>AGOSTO 2021</p> <p>1. El equipo ejecutor del proyecto de la Dirección de Pesca Artesanal, esta coordinando con los GADS y Cooperaciones Internacionañles, la ejecución de las ferias que se realizaraán en la provincia de Manabí, Esmeraldas, Guayas, estos eventos se realizarán dentro del Día del Cangrejo Ecuatoriano.</p> <p>Estas actividades se repotarán en el mes de septiembre del año en curso.</p>	Cedeño Vera, Carlos Favio	30/08/2021 - 03:22 PM
<p>JULIO 2021</p> <p>1. El equipo ejecutor del proyecto de la Dirección de Pesca Artesanal, esta coordinando con los GADS y Cooperaciones Internacionañles, la ejecución de las ferias que se realizaraán en la provincia de Manabí, Esmeraldas, Guayas, estos eventos se realizarán dentro del Día del Cangrejo Ecuatoriano.</p>	Cedeño Vera, Carlos Favio	02/08/2021 - 02:36 PM
<p>JUNIO 2021</p> <p>1. El equipo ejecutor del proyecto, esta coordinando con los GADS y Cooperaciones las realizaciones de las ferias que se ejecutaran en la provincia de Manabí, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y El Oro.</p>	Cedeño Vera, Carlos Favio	01/07/2021 - 03:16 PM
<p>MAYO 2021</p> <p>1. Coordinación con las diferentes cooperaciones y GADS, para ejecutar las ferias y eventos de comercialización que se realizará en los meses de agosto hasta diciembre del año en curso.</p>	Cedeño Vera, Carlos Favio	01/06/2021 - 07:05 PM
<p>ABRIL 2021</p> <p>1. Mediante Oficio Nro. MPCEIP-SRP-2021-1290-O, el Director de Pesca Artesanal le solicita al alcalde el GAD Jama, la articulación institucional para fortalecer la comercialización de la pesca con valor agregado (HITO No. 11, CUMPLIDO).</p> <p>2. Mediante Memorando Nro. MPCEIP-SRP-2021-10214-M, el líder del proyecto le solicita al Director de Pesca Artesanal, la gestión para la reprogramación de hitos del proyecto de gasto corriente.</p> <p>3. Mediante Memorando Nro. MPCEIP-SRP-2021-0238-M, el Subsecretario le pone a conocimiento al Coordinador General de Planificación Estratégica del MPCEIP, la reprogramación de hitos del proyecto de gasto corriente que lleva a cabo la Dirección de Pesca Artesanal.</p> <p>4. Mediante Memorando Nro. MPCEIP-CGPGE-2021-0333-M, de fecha 17 de abril de 2021, el Coordinador General de Planificación Estratégica del MPCEIP, le informa al Subsecretario de Recursos Pesqueros la aprobación de la reprogramación de hitos del proyecto de gasto corriente.</p>	Cedeño Vera, Carlos Favio	29/04/2021 - 09:27 AM
<p>MARZO 2021</p> <p>1. Articulación con el GAD de Tosagua, solicitando el apoyo institucional, efectuada (HITO No. 8, CUMPLIDO).</p>	Cedeño Vera, Carlos Favio	05/04/2021 - 08:22 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2.Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras del cantón Tosagua de la provincia de Manabí, realizada (HITO No. 9, CUMPLIDO). 3.Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Tosagua de la provincia de Manabí, realizada (HITO No. 3).		
FEBRERO 2021 1.Asistencia técnica a la Asociación de Producción Pesquera Artesanal Pedro el Pescador (HITO No. 6, CUMPLIDO). 2.Por motivos de la pandemia del COVID 19, algunas de las socias tuvieron síntomas positivos del COVID 19, mismo que por pedido de ellas, se suspendió la exhibición de productos para el mes de marzo de 2021 (HITO No. 7, CUMPLIDO).	Cedeño Vera, Carlos Favio	01/03/2021 - 02:48 PM
ENERO 2021 1.Acta de constitución del proyecto firmadas por los responsables del proyecto de gasto corriente (HITO No. 1, CUMPLIDO). 2.Elaboración de propuesta de comercialización de la pesca artesanal 2021 (HITO No. 2, CUMPLIDO). 3.Capacitación a los analistas de Fomento Productivo el cual participarán en el proyecto (HITO No. 3, CUMPLIDO). 4.Mediante Oficio Nro. MPCEIP-SRP-2021-0430-O, el Director de Pesca Artesanal le pone a conocimiento a la Alcaldesa del GAD Sucre, la ejecución del evento que se realizará en el cantón Sucre (HITO No. 4, CUMPLIDO). 5.Mediante Oficio Nro. MPCEIP-SRP-2021-0429-O, el Director de Pesca Artesanal pone a conocimiento a las organizaciones pesqueras que participarán en el proyecto de gasto corriente (HITO No. 5, CUMPLIDO).	Cedeño Vera, Carlos Favio	03/02/2021 - 03:02 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Contagio COVID 19 que afecta a las organizaciones de la EPS en la comercialización de la pesca con valor agregado.	22/03/2021	Carlos Favio Cedeño Vera	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. El poco interés de las organizaciones pesqueras artesanales CAUSARÍA la no realización de las actividades de comercialización planificadas en el proyecto.	16/01/2021	Carlos Favio Cedeño Vera	70 %	80	56	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Muisne
3	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > San Lorenzo
4	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jama
5	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Sucre
6	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Tosagua
7	Zona 5 - Litoral > Guayas > Balao

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
8	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Babahoyo
9	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Quevedo
10	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Vinces
11	Zona 7 - Sur > El Oro > El Guabo
12	Zona 7 - Sur > El Oro > Huaquillas
13	Zona 7 - Sur > El Oro > Machala
14	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Acta de constitución del proyecto, firmada.	4-Inicio de Trabajo	08/01/2021		08/01/2021		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Propuesta de eventos o actividades de comercialización para el año 2021, aprobada.	5-Entregables Intermedios	11/01/2021		11/01/2021		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Capacitación a los Analistas de la Dirección de Pesca Artesanal, realizada	5-Entregables Intermedios	15/01/2021		15/01/2021		Sí	3.0
4	EJECUCIÓN: Articulación con el GAD de Sucre, solicitando el apoyo institucional, efectuada.	5-Entregables Intermedios	02/02/2021		02/02/2021		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Convocatoria a las organizaciones pesqueras participantes en los eventos de comercialización, efectuada.	5-Entregables Intermedios	02/02/2021		02/02/2021		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras del cantón Sucre de la provincia de Manabí, realizada.	9-Entregables Formales	08/02/2021		08/02/2021		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Sucre de la provincia de Manabí, realizada.	9-Entregables Formales	12/02/2021		12/02/2021		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: Articulación con el GAD de Tosagua, solicitando el apoyo institucional, efectuada.	5-Entregables Intermedios	04/03/2021		04/03/2021		Sí	2.0
9	EJECUCIÓN: Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras del cantón Tosagua de la provincia de Manabí, realizada.	9-Entregables Formales	09/03/2021		09/03/2021		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Tosagua de la provincia de Manabí, realizada.	9-Entregables Formales	22/03/2021		24/09/2021		Sí	3.0
11	EJECUCIÓN: Articulación con el GAD de Jama, solicitando el apoyo institucional, efectuada.	9-Entregables Formales	05/04/2021		05/04/2021		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras del cantón Jama de la provincia de Manabí, realizada.	9-Entregables Formales	15/04/2021		04/10/2021		Sí	2.0


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	EJECUCIÓN: Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Jama de la provincia de Manabí, realizada.	9-Entregables Formales	27/04/2021		15/10/2021		Sí	3.0
14	EJECUCIÓN: Primer Informe de avances de actividades y resultados al Director de Pesca Artesanal, presentado.	9-Entregables Formales	07/05/2021		19/10/2021		Sí	3.0
15	EJECUCIÓN: Articulación con la Prefectura de Guayas, solicitando el apoyo institucional, efectuada.	5-Entregables Intermedios	04/06/2021		20/10/2021		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras de los cantones Guayaquil y Balao provincia de Guayas, realizada.	9-Entregables Formales	10/06/2021		22/10/2021		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Guayaquil de la provincia de Guayas, realizada.	9-Entregables Formales	24/06/2021		28/10/2021		Sí	3.0
18	EJECUCIÓN: Articulación con la Prefectura de los Ríos, GAD Vinces, GAD Babahoyo, GAD Quevedo, solicitando el apoyo institucional, efectuada.	5-Entregables Intermedios	01/07/2021		29/10/2021		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras de los cantones Vinces, Babahoyos y Quevedo de la provincia de Los Ríos, realizada.	9-Entregables Formales	12/07/2021		01/11/2021		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: Feria productiva o actividad de comercialización en provincia de Los Ríos, realizada.	9-Entregables Formales	30/07/2021		09/11/2021		Sí	3.0
21	EJECUCIÓN: Articulación con la Prefectura de Esmeraldas, solicitando el apoyo institucional, efectuada.	5-Entregables Intermedios	02/08/2021		10/11/2021		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN: Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras de los cantones San Lorenzo, Esmeraldas y Muisne de la provincia de Esmeraldas, realizada.	9-Entregables Formales	11/08/2021		12/11/2021		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN: Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Esmeraldas, realizada.	9-Entregables Formales	26/08/2021		17/11/2021		Sí	3.0
24	EJECUCIÓN: Segundo Informe de avances de actividades y resultados al Director de Pesca Artesanal, presentado.	9-Entregables Formales	08/09/2021		22/11/2021		Sí	3.0
25	EJECUCIÓN: Articulación con la Prefectura de El Oro, solicitando el apoyo institucional, efectuada.	5-Entregables Intermedios	23/11/2021		23/11/2021		Sí	2.0
26	EJECUCIÓN: Asistencia técnica a las organizaciones pesqueras de los cantones Huaquillas, Machala, El Guabo	9-Entregables Formales	26/11/2021		26/11/2021		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de la provincia de El Oro, realizada.							
27	EJECUCIÓN: Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Machala, realizada.	9-Entregables Formales	02/12/2021	02/12/2021			No	3.0
28	EJECUCIÓN: Informe Final del Proyecto aprobado.	9-Entregables Formales	17/12/2021	17/12/2021			No	10.0
29	CIERRE: Acta de Cierre del proyecto, firmada.	9-Entregables Formales	28/12/2021	28/12/2021			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de ferias productivas y/ o actividades de comercialización ejecutadas		100.00 %	6	6	01/02/2021	Noviembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	1.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar las capacidades productivas del sector pesquero artesanal MEDIANTE la asistencia técnica al diseño de proyectos, programas, estrategias de comercialización y capacitaciones impartidas a nivel nacional.
2	Incrementar la eficiencia en la regularización de la actividad pesquera artesanal en todas sus fases MEDIANTE la carnetización, legalización de documentos y emisión de informes.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO No. 1. Acta de constitución del proyecto, firmada.	A.1.pdf	18/01/2021
2	ASOCIACIÓN HITO No. 10. Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Tosagua de la provincia de Manabí, realizada.	B.1.pdf	04/10/2021
3	ASOCIACIÓN HITO No. 11. Articulación con el GAD de Jama, solicitando el apoyo institucional, efectuada.	B.2.pdf	05/04/2021
4	ASOCIACIÓN HITO No. 12. Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras del cantón Jama de la provincia de Manabí, realizada.	B.3.pdf	06/10/2021
5	ASOCIACIÓN HITO No. 13. Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Jama de la provincia de Manabí, realizada.	B.4.pdf	01/12/2021
6	ASOCIACIÓN HITO No. 14. Primer Informe de avances de actividades y resultados al Director de Pesca Artesanal, presentado.	B.5.pdf	19/10/2021
7	ASOCIACIÓN HITO No. 15. Articulación con la Prefectura de Guayas, solicitando el apoyo institucional, efectuada.	B.6.pdf	20/10/2021
8	ASOCIACIÓN HITO No. 16. Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras de los cantones Guayaquil y Balao provincia de Guayas, realizada.	B.7.pdf	22/10/2021
9	ASOCIACIÓN HITO No. 17. Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Guayaquil de la provincia de Guayas, realizada.	B.8.pdf	28/10/2021
10	ASOCIACIÓN HITO No. 18. Articulación con la Prefectura de los Ríos, GAD Vinces, GAD Babahoyo, GAD Quevedo, solicitando el apoyo institucional, efectuada.	B.9.pdf	29/10/2021
11	ASOCIACIÓN HITO No. 19. Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras de los cantones Vinces,	C.1.pdf	04/11/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	Babahoyos y Quevedo de la provincia de Los Ríos, realizada.		
12	ASOCIACIÓN HITO No. 2. Propuesta de eventos o actividades de comercialización para el año 2021, aprobada.	A.2.pdf	18/01/2021
13	ASOCIACIÓN HITO No. 20. Feria productiva o actividad de comercialización en provincia de Los Ríos, realizada.	C.2.pdf	01/12/2021
14	ASOCIACIÓN HITO No. 21. Articulación con la Prefectura de Esmeraldas, solicitando el apoyo institucional, efectuada.	C.3.pdf	11/11/2021
15	ASOCIACIÓN HITO No. 22. Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras de los cantones San Lorenzo, Esmeraldas y Muisne de la provincia de Esmeraldas, realizada.	C.4.pdf	12/11/2021
16	ASOCIACIÓN HITO No. 23. Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Esmeraldas, realizada.	C.5.pdf	17/11/2021
17	ASOCIACIÓN HITO No. 24. Segundo Informe de avances de actividades y resultados al Director de Pesca Artesanal, presentado.	C.6.pdf	01/12/2021
18	ASOCIACIÓN HITO No. 25. Articulación con la Prefectura de El Oro, solicitando el apoyo institucional, efectuada.	C.7.pdf	01/12/2021
19	ASOCIACIÓN HITO No. 26. Asistencia técnicas a las organizaciones pesqueras de los cantones Huaquillas, Machala, El Guabo de la provincia de El Oro, realizada.	C.8.pdf	02/12/2021
20	ASOCIACIÓN HITO No. 3. Capacitación a los Analistas de la Dirección de Pesca Artesanal, realizada.	A.3.pdf	22/01/2021
21	ASOCIACIÓN HITO No. 4. Articulación con el GAD de Sucre, solicitando el apoyo institucional, efectuada.	A.4.pdf	02/02/2021
22	ASOCIACIÓN HITO No. 5. Convocatoria a las organizaciones pesqueras participantes en los eventos de comercialización, efectuada.	A.5.pdf	02/02/2021
23	ASOCIACIÓN HITO No. 6. Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras del cantón Sucre de la provincia de Manabí, realizada.	A.6.pdf	08/02/2021
24	ASOCIACIÓN HITO No. 7. Feria productiva o actividad de comercialización en el cantón Sucre de la provincia de Manabí, realizada.	A.7.pdf	12/02/2021
25	ASOCIACIÓN HITO No. 8. Articulación con el GAD de Tosagua, solicitando el apoyo institucional, efectuada.	A.8.pdf	04/03/2021
26	ASOCIACIÓN HITO No. 9. Asistencias técnicas a las organizaciones pesqueras del cantón Tosagua de la provincia de Manabí, realizada.	A.9.pdf	17/03/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Castro Briones, Edwin Xavier	Patrocinador del proyecto	Director de Pesca Industrial	ecastro@produccion.gob.ec	
Cedeño Vera, Carlos Favio	Líder del proyecto	Especialista de Fomento Productivo	ccedeno@produccion.gob.ec	
Vinueza Mosquera, Tanya Gabriela	Titular del proyecto	Directora de Pesca Artesana, Encargada	tvinueza@produccion.gob.ec	
